تقرير متابعة المواضيع

عن الفترة: الربع الثالث 2026 · حتى تاريخ 11 أكتوبر 2026

أولاً: الملخص التنفيذي


بلغ عدد المواضيع المسجلة 6 مواضيع، أُقفل منها 2، ولا يزال 4 قيد المتابعة، منها موضوع معلّق بانتظار اعتماد الميزانية. وتجاوز موضوع «تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي» تاريخ استحقاقه بـ 5 أيام، ويتوقف إنجازه على اكتمال التقييم الفني للعروض من قبل لجنة الفحص. وبلغ متوسط مدة إقفال المواضيع المنجزة 46 يوماً.

إجمالي المواضيع	مفتوح	قيد الإجراء	معلّق	متأخر عن الاستحقاق	مقفل
6	1	2	1	1	2

ثانياً: بيان المواضيع وجدولها الزمني

◆ إجراء مسجّل ¦ تاريخ الاستحقاق | تاريخ التقرير

م	المرجع	الموضوع	المسؤول	الحالة	الاستحقاق
1	M-001	تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي	أحمد العتيبي	قيد الإجراء	2026/10/06
2	M-002	معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية	سارة القحطاني	مقفل	2026/10/01
3	M-003	ربط النظام مع الجهة الخارجية	خالد الشهري	قيد الإجراء	2026/10/26
4	M-004	توريد أجهزة الحاسب للفرع الجديد	فهد الدوسري	معلّق	2026/10/20
5	M-005	تحديث سياسة العمل عن بعد	نورة الحربي	مفتوح	2026/11/15
6	M-006	تجهيز قاعة التدريب	سارة القحطاني	مقفل	2026/08/31

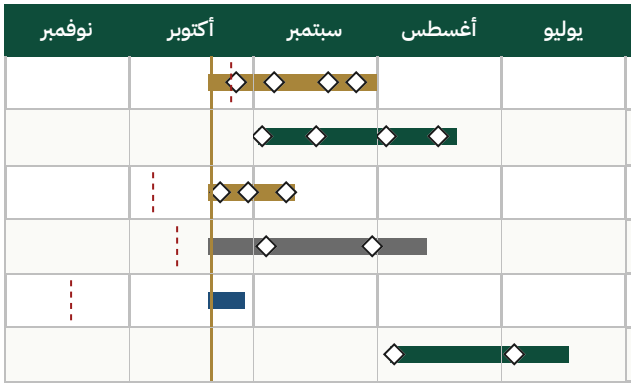

ثالثاً: أبرز المستجدات خلال الفترة

م	التاريخ	المرجع	نوع الإجراء	التفاصيل
1	2026/10/09	M-003	تحديث	استلام بيئة الاختبار – ربط النظام مع الجهة الخارجية
2	2026/10/05	M-001	متابعة	متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص – تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي
3	2026/10/02	M-003	اجتماع	اجتماع فني مع فريق الجهة – ربط النظام مع الجهة الخارجية
4	2026/09/29	M-002	إقفال	إغلاق جميع الملاحظات من المراجعة الداخلية – معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية

بيان متابعة موضوع: تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي

المرجع M-001 · عقود

أولاً: بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة: إدارة المشتريات	المسؤول: أحمد العتيبي	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/09/01	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/06	مدة المتابعة: 40 يوماً	التأخير: 5 أيام

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	نوع الإجراء	التفاصيل	الجهة / المنفذ	المدة (يوم)
1	2026/09/01	فتح الموضوع	تسجيل الموضوع وتحديد متطلبات العقد الجديد	—	—
2	2026/09/06	مراسلة	إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة	أحمد العتيبي	5
3	2026/09/13	اجتماع	اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل	لجنة العقود	7
4	2026/09/26	إجراء	طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين	إدارة المشتريات	13
5	2026/10/05	متابعة	متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص	أحمد العتيبي	9

الوضع الحالي: الموضوع متأخر 5 أيام عن تاريخ الاستحقاق، وآخر إجراء عليه بتاريخ 2026/10/05 (متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص). مضى على آخر إجراء 6 أيام.

إعداد
مكتب إدارة المشاريع

مراجعة
مدير إدارة المتابعة والتخطيط


اعتماد
الرئيس التنفيذي

أربعة من ستة مواضيع لا تزال مفتوحة؛ موضوع واحد تجاوز استحقاقه بخمسة أيام ويتوقف على قرار لجنة الفحص، وآخر معلّق بانتظار اعتماد الميزانية

6	4	33%	1	46 يوماً
مواضيع مسجّلة	قيد المتابعة	نسبة الإقفال	متأخر عن الاستحقاق	متوسط مدة الإقفال

الجدول الزمني للمواضيع

يوليو – نوفمبر 2026

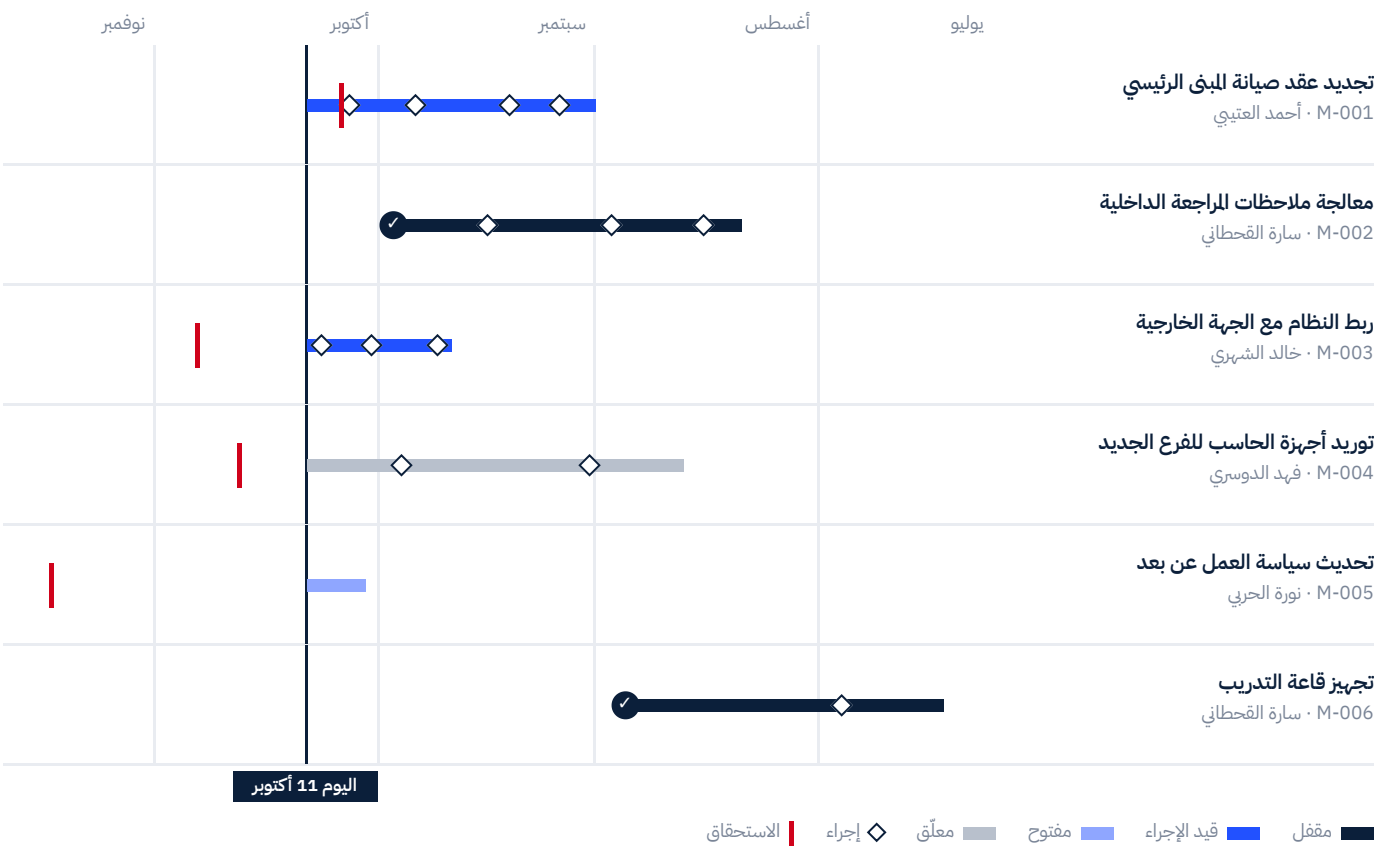

أبرز النقاط

1. **عقد صيانة المبنى** متأخر 5 أيام؛ العروض الثلاثة لدى لجنة الفحص منذ 6 أيام دون قرار.
2. **توريد أجهزة الفرع الجديد** معلّق منذ 13 يوماً بانتظار اعتماد الميزانية، واستحقاقه بعد 9 أيام.
3. **ربط النظام** يسير وفق الخطة؛ استُلمت بيئة الاختبار ويتبقى 15 يوماً.
4. أُقفل موضوعان خلال الربع بمتوسط 46 يوماً، كلاهما قبل الاستحقاق.

القرارات المطلوبة

1. عقد اجتماع لجنة الفحص هذا الأسبوع لترسية عقد الصيانة.
2. البت في ميزانية أجهزة الفرع الجديد قبل 20 أكتوبر 2026.

عقد صيانة المبنى الرئيسي متأخر 5 أيام؛ اكتمل الطرح واستُقبلت ثلاثة عروض، والتقييم الفني متوقف على انعقاد لجنة الفحص

بطاقة الموضوع

المرجع	M-001
التصنيف	عقود
الجهة	إدارة المشتريات
المسؤول	أحمد العتيبي
الأولوية	عالية
الحالة	قيد الإجراء
تاريخ الفتح	2026/09/01
الاستحقاق	2026/10/06
عدد الإجراءات	5
آخر إجراء	قبل 6 أيام

الوقت المستهلك من المهلة 114%

2026/09/01 — الاستحقاق 2026/10/06 — اليوم

المسار الزمني للإجراءات

المراحل أعلى المحور · الأيام بين الإجراءات أسفله



الخطوات التالية

- انعقاد لجنة الفحص واعتماد التقييم الفني
- التقييم المالي والترسية على أفضل العروض
- توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول

المخاطر

- انقطاع خدمات الصيانة بعد انتهاء العقد الحالي
- تأخر إضافي إن لم تنعقد اللجنة هذا الأسبوع

الشركة الوطنية للخدمات
إدارة المتابعة والتخطيط

تقرير متابعة المواضيع

لوحة متابعة المواضيع المفتوحة والمقفلة ومخططها الزمني

إجمالي المواضيع	قيد المتابعة	نسبة الإقفال	متأخر عن الاستحقاق	متوسط مدة الإقفال
6	4	33%	1	46 يوم

المخطط الزمني للمواضيع

يوليو – نوفمبر 2026



توزيع الحالات



مفتوح	1
قيد الإجراء	2
معلّق	1
مقفل	2

يحتاج انتباهك

تجديد عقد صيانة المبنى
متأخر 5 أيام · بانتظار لجنة الفحص

توريد أجهزة الفرع الجديد
معلّق 13 يوماً · الاستحقاق بعد 9 أيام

تحديث سياسة العمل عن بعد
لا إجراءات منذ الفتح قبل 8 أيام

تجديد عقد صيانة المبنى الرئيسي

انتهاء عقد الصيانة الحالي ويلزم الطرح والترسية قبل نهاية الربع لضمان استمرارية الخدمة.

قيد الإجراء | متأخر 5 أيام | أولوية عالية

من المهلة مستهلك 114%
40 يوماً من أصل 35

مسار الإجراءات

من الفتح حتى اليوم · الأيام بين كل إجراءين

1 سبتمبر
فتح الموضوع
تسجيل الموضوع وتحديد متطلبات العقد الجديد

5 يوم

6 سبتمبر
مراسلة
إرسال خطاب لإدارة المشتريات بطلب طرح المنافسة
أحمد العتيبي

7 يوم

13 سبتمبر
اجتماع
اجتماع مع المشتريات لمراجعة كراسة الشروط واعتماد نطاق العمل
لجنة العقود

13 يوم

26 سبتمبر
إجراء
طرح المنافسة واستقبال ثلاثة عروض من المقاولين المؤهلين
إدارة المشتريات

9 يوم


5 أكتوبر
متابعة
متابعة التقييم الفني للعروض – بانتظار اجتماع لجنة الفحص
أحمد العتيبي

6 يوم

11 أكتوبر
الوضع الحالي
متأخر 5 أيام عن الاستحقاق

الإجراءات على المقياس الزمني الفعلي

1 سبتمبر 2026 – 11 أكتوبر 2026



بيانات الموضوع

الجهة ذات العلاقة	إدارة المشتريات
المسؤول	أحمد العتيبي
تاريخ الفتح	2026/09/01
تاريخ الاستحقاق	2026/10/06
عدد الإجراءات	5
متوسط الفاصل	9 أيام
أطول فاصل	13 يوماً
آخر إجراء	قبل 6 أيام

أنواع الإجراءات

مراسلة	1
اجتماع	1
إجراء	1
متابعة	1
